

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
info@ramakcompany.com 0566157166 الإدارة 0544714479 مدير المشاريع التواصل

## Works Inspection Request - WIR / طلب إستلام أعمال

| | | |
|---|---|---|
| MIR Serial Number: | طلب تسليم كور اسفلت | الرقم التسلسلي: |
| Date | ٢٠٢٤/٠٦/٢٩ | التاريخ |
| Location | جدة | المنطقة |
| Project Title | مشروع تلال الغروب | إسم المشروع |
| Consultant | مكتب رمك للإستشارات الهندسية | الإستشاري |
| Contractor : | شركة طرق الرياض للمقاولات | المقاول |

## Part A: By the Contractor: / الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

**Attachments (tick as appropriate)** / المرفقات

| | | |
|---|---|---|
| ■ Sketch attached to show the location(s) / كروكي توضيحي للموقع | ☐ Inspection Check list / قائمة الفحص | ☐ Surveyor Field Sheet (if any) / سجل إستلام الأعمال المساحية |
| ■ Approved Shop Drawing / الرسومات التنفيذية المعتمدة | ■ Test Reports (if any) / تقارير إختبارات ( إن وجدت) | ☐ Ohters(state) / أخري |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline: التصنيف | ■ Civil إنشائي | ☐ Architectural معماري | ☐ Mechanical ميكانيكا | ☐ Electrical كهرباء ☐ | ☐ Other (state) أخري |

**Description of Works to be inspected and / or tested:** / وصف الأعمال المطلوب تسليمها

عمل كور لاسفلت شارع 2 بلوك 11

ROAD 02 BLOCK 11

**Works Quantity:**

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name: الاسم: | Signature التوقيع | Designation المسمى الوظيفي: | Date: 29/06/2024 التاريخ : |

(Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات – RIYADH ROADS CONTRACTING – 1010254003 – جدة)

## Part B: By the Consultant: / الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

**Site Inspector's Comments:** / ملاحظات القائم بالإستلام

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name: الإسم | Signature: التوقيع: | Designation المسمى الوظيفي: | Date: التاريخ |

(Stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية – مشاريع البنية التحتية)

**Witnessed Site Test Results (if any):** نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

| | | |
|---|---|---|
| ☑ | Passed | مقبول |
| ☐ | Failed | مرفوض |
| ☐ | N/A | لا يوجد |

**Resident Engineer Final Comments & Decision:** / ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Approved يعتمد | ☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات | ☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم | ☐ Rejected مرفوض |

| | | |
|---|---|---|
| Name: الإسم | Signature التوقيع: | Date: التاريخ |

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

**Proficiency Laboratory for building materials**
Geotechnical studies - Testing Labs for Soil, Concrete, Asphalt & Construction Materials

الكفاءة
Proficiency Lab

**شركة مختبر الكفاءة لمواد البناء**
(فحص التربة والأساسات والخرسانة والأسفلت والمواد الانشائية)


| Client | شركة طرق الرياض للمقاولات | Report No. | PRO-240463.39 |
|---|---|---|---|
| Project | تنفيذ اعمال البنية التحتية | Test Date | 29/6/2024 |
| Location | جدة - حى الامير فواز - مخطط تلال الغروب | Report Date | 30/6/2024 |
| Location / Station | Block 11 Road 02 STA. 0+000 to STA. 0+214 | Tested By | Mohmoud |
| Description: | BBC | | |


## ASPHALT CORES

| Sample No. | STATIONS | Thickness (cm) | Wt. In Air (g) | Wt. in Water (g) | Wt. in SSD (g) | VOLUME ($cm^3$) | Gmb ($g/cm^3$) | Gmm ($g/cm^3$) | Compaction (%) | Required Compaction (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA. 0+010 | 9.4 | 1507.8 | 880 | 1512 | 632 | 2.386 | 2.613 | 91.3 | |
| 2 | STA. 0+040 | 7.3 | 1103.8 | 649 | 1109 | 460 | 2.400 | 2.613 | 91.8 | |
| 3 | STA. 0+070 | 7.8 | 1209.2 | 701 | 1213 | 512 | 2.362 | 2.613 | 90.4 | |
| 4 | STA. 0+140 | 7.1 | 1048.1 | 608 | 1052 | 444 | 2.361 | 2.613 | 90.3 | |
| 5 | STA. 0+170 | 7.7 | 1226.7 | 712 | 1229 | 517 | 2.373 | 2.613 | 90.8 | |
| 6 | STA. 0+200 | 7.1 | 1126.3 | 653 | 1129 | 476 | 2.366 | 2.613 | 90.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Average Thick.CM | 7.7 | | | | | Average Comp. | | 90.9 | |



Room 372575 commercial Jeddah, license 142, Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylabb.com www.proficiencylabb.com Mob.:0552210350
30 St. - Ar Rabwah Dist. - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

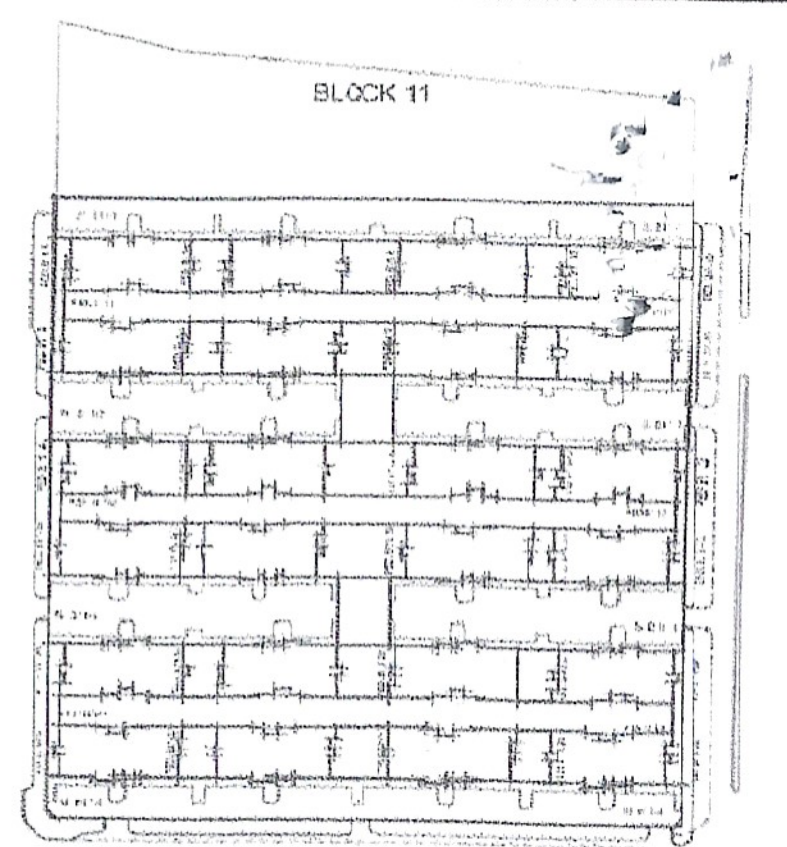

| | |
|---|---|
| اتجاة تصريف المياة | |
| الارض الطبيعية | |
| الخط التصميى | |
| اسفلت قائم | |




المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان




المطور/شركة ساني العامرية




الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية




الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية




المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات




تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحي الامير فواز شمال - مدينة جدة

| | |
|---|---|
| مساح: | |
| رسم: | |
| تصميم: | |
| تدقيق: | |
| يعتمد: | |
| تاريخ: | |
| رقم اللوحة: | |
| مقياس الرسم: | 1:500 / 1:500 |

NO. | PLAN

مديرعام الدراسات والتصاميم | مديرادارة تصميم الطرق

شــــــارع عــــرض ٢٧،٠٠ متر

| Plot | Level |
|---|---|
| 238 | 53.01 |
| 237 | 52.18 |
| 236 | 51.27 |
| 235 | 50.46 |
| 239 | 52.94 |
| 240 | 52.26 |
| 241 | 51.49 |
| 242 | 50.81 |
| 246 | 52.94 |
| 245 | 52.26 |
| 244 | 51.49 |
| 243 | 50.81 |
| 247 | 52.81 |
| 248 | 52.32 |
| 249 | 51.64 |
| 250 | 51.15 |
| 253 | 52.32 |
| 252 | 51.64 |
| 251 | 51.15 |
| 255 | 52.81 |
| 256 | 52.42 |
| 257 | 51.99 |
| 258 | 51.60 |
